Santiago, 9 de octubre de 2018

Señor
José Venegas Maluenda,
Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Energía.
PRESENTE

REF: Actualización carta gantt CH Río Negro Hornopirén

De nuestra consideración,

En relación al proyecto denominado CH Río Negro Hornopirén propiedad de Hidroenergía Chile Ltda. que fue declarado dentro del Proyecto de Reposición Eficiente mediante Resolución Exenta N° 610 del 27 de agosto de 2018 que "Aprueba el Informe Técnico de Estudio de Planificación y Tarificación del sistema Mediano de Hornopirén" y de acuerdo con:


- Lo establecido en la Resolución Exenta N° 154 del 21 de febrero 2018 que "Aprueba Las Bases Definitivas para la realización de los Estudios de los sistemas Medianos de aysén, Palena, General Carrera, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams, Cochamó y Hornopirén" donde se menciona: "Desde la incorporación de un proyecto al catastro, será de responsabilidad de los promotores actualizar, durante el desarrollo del Estudio, el avance en el desarrollo del mismo de acuerdo a la carta gantt presentada. La actualización de la información en los términos indicados precedentemente, permitirá al promotor mantener su calidad de integrante del catastro."
- Que el "Informe Técnico Definitivo de Estudio de Planificación y Tarificación del sistema Mediano de Hornopirén" aún no se ha emitido.
- Que a la fecha no se cuenta con los datos de todos los actores del sistema en particular de la central Nanogener para poder avanzar con la "Solicitud de Conexión" en las redes del Sistema Mediano de Hornopirén que tiene fecha de Puesta en Servcicio marzo 2019.
- Que dado lo antes mencionado el proceso de conexión se tardará más de lo que se consideró previamente.

Vengo en actualizar la carta gantt en archivo adjunto de acuerdo con la referencia.

Quedando a su entera disposición frente a antecedentes extra que puedan necesitar, se despide atentamente,

Enrico Gatti Sani
MCH Río Negro Hornopirén

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**Cronograma Rio Negro**	**457 días**	**2/4/18**	**31/12/19**
1	Ingenieria y Permisos	110 días	2/4/18	17/12/18
2	Contrato y orden de compra equipos electromecanicos	40 días	2/11/18	27/12/18
3	Construccion OOCC	210 días	18/12/18	7/10/19
4	Cotrato y orden de compra tuberia forzada	40 días	2/11/18	27/12/18
5	Movimiento tierra y tendido tuberia	210 días	11/1/19	31/10/19
6	Instalacion equipos electromecanicos	60 días	9/8/19	31/10/19
7	Refuerzo linea	120 días	25/4/19	9/10/19
8	Pruebas y puesta en servicio	43 días	1/11/19	31/12/19

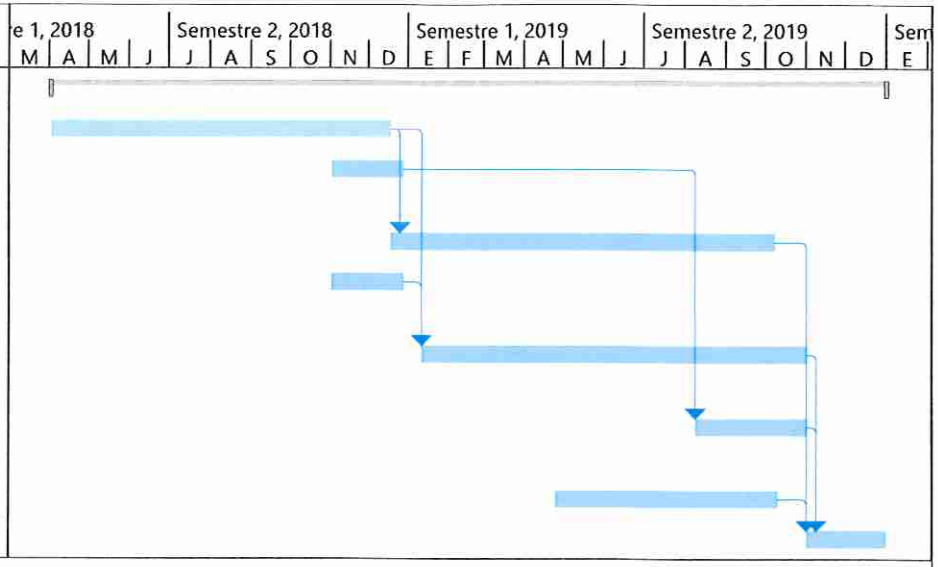

Cronograma Rio Negro

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo
División	Resumen inactivo	solo fin
Hito	Tarea manual	Tareas externas
Resumen	solo duración	Hito externo
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Progreso
Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso manual
